



**CORTE DEI CONTI**

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

**ATTUAZIONE DEL PNRR DEL COMUNE DI BRESCIA  
CONTROLLO SULLA GESTIONE**

(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77)

**DELIBERAZIONE 30 gennaio 2024, n. 25 / 2024 / GEST**



CORTE DEI CONTI

**PRESIDENTE:** ANTONIO BUCCARELLI

**MAGISTRATO RELATORE:** MAURA CARTA

**Hanno collaborato**

Giulia Milani

Giuseppe Pro

# DELIBERAZIONE



**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott. Antonio Buccarelli	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere (relatore)
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario

nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024 ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte stessa in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Tuel);

VISTO l'articolo 7, commi 7 e 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche ed integrazioni, che ha rafforzato le funzioni di controllo della Corte dei conti al fine di un più efficace coordinamento della finanza pubblica, adeguando il controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, riguardante il controllo sulla gestione della Corte dei conti sull'impiego delle risorse provenienti dai fondi di cui al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);

VISTA la circolare n.27 del MEF - Ragioneria Generale di Stato Prot.175451 del 21 giugno 2022 che introduce il sistema ReGiS per il monitoraggio degli interventi del PNRR;

VISTA la circolare n.29 del MEF-Ragioneria Generale di Stato prot. 201590 del 26 luglio 2022 che chiarisce la relazione tra i flussi finanziari e il sistema ReGiS per il monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti del PNRR;

VISTA la deliberazione SRCLOM/251/2022/GEST sulla ricognizione dei progetti del PNRR e PNC del Comune di Brescia;

VISTA la deliberazione SRCLOM/40/2023/INPR con cui la Sezione ha definito gli obiettivi della programmazione dell'attività di controllo per l'anno 2023;

VISTA la deliberazione SRCLOM/173/2023/INPR di rimodulazione dell'attività di controllo programmata per il 2023;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n.16/2023/FRG del 27/10/2023 "Contributo alla relazione ex art. 7, comma 7, d.l. 31 maggio 2021, n. 77";

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite SSRRCO/34/2023/REF "Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel primo semestre 2023, redatta ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77";

VISTA la nota del 14 aprile 2023, prot. Cdc n. 4296, con la quale il Comune di Brescia ha risposto alla richiesta istruttoria inviata dalla Sezione in data 21 marzo 2023, prot. n. 4089;

VISTA l'ulteriore nota del 24 novembre 2023, prot. Cdc n. 25111, con la quale il Comune di Brescia ha risposto all'ulteriore nota istruttoria inviata dalla Sezione in data 3 novembre 2023, prot. Cdc n. 2420;

VISTA l'ordinanza n. 23 del 15 gennaio 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, dott.ssa Maura Carta

#### DELIBERA

di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio in camera di consiglio, la relazione avente ad oggetto "Attuazione del PNRR del Comune di Brescia, controllo sulla gestione ex art. 7, comma 7, d.l. 31 maggio 2021 n. 77".

La presente deliberazione e l'unita relazione saranno inviate al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale, nonché all'Organo di revisione del Comune del Comune di Brescia.

La presente deliberazione è soggetta all'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il Comune dovrà dare riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

Il Relatore  
(Maura Carta)

Il Presidente  
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il  
30 gennaio 2024

Il Funzionario preposto  
al servizio di supporto  
(Susanna De Bernardis)

## INDICE

<b>1. INQUADRAMENTO NORMATIVO .....</b>	<b>9</b>
<b>2. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI.....</b>	<b>11</b>
2.1 Avanzamento procedurale.....	15
2.2 Avanzamento finanziario.....	19
2.3 Effetti della rimodulazione .....	22
<b>3. GOVERNANCE E SISTEMI DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL     PNRR .....</b>	<b>26</b>
<b>4. SITUAZIONE DEL PERSONALE.....</b>	<b>27</b>
4.1 Esperti della Regione .....	27
4.2. Assunzioni di personale a tempo determinato .....	28
<b>5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE .....</b>	<b>29</b>

## INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Progetti PNRR suddivisi per missione e per tipologia.....	12
Tabella 2 - Importo dei Progetti PNRR.....	13
Tabella 3 - Avanzamento procedurale.....	16
Tabella 4 - Risorse accertate in bilancio e pagamenti.....	20
Tabella 5 - Anticipazioni per missioni .....	20
Tabella 6 - Progetti oggetto di possibile definanziamento .....	23
Tabella 7 - Stato di attuazione dei progetti oggetto di possibile definanziamento.....	24
Tabella 8 - Elenco dettagliato dei progetti del Comune di Brescia .....	32

## INDICE DEI GRAFICI

Grafico 1- Finanziamento PNRR per progetto nelle missioni .....	14
Grafico 2 - Fonti dei finanziamenti per i progetti PNRR.....	14
Grafico 3 - Stato di attuazione procedurale .....	16
Grafico 4 - Stato di attuazione finanziaria (Pagamenti su fondi accertati in bilancio) .	21
Grafico 5 - Stato di attuazione procedurale dei progetti oggetto di definanziamento.	25

**ATTUAZIONE DEL PNRR DEL COMUNE DI  
BRESCIA**

**CONTROLLO SULLA GESTIONE**

(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77)

## 1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

La Sezione regionale di controllo della Lombardia, proseguendo la ricognizione avviata nel corso del 2022 sui progetti del PNRR di cui il Comune di Brescia è “soggetto attuatore” -delibera n. 251/2022/GEST- ne limita l’attività al solo controllo sulla gestione in ragione della sopravvenuta normativa.

Nel dettaglio, la Sezione ha rimodulato la programmazione dell’attività di controllo dopo l’entrata in vigore dall’art. 1, comma 12 quinquies, del d. l. 22 aprile 2023 n. 44, convertito nella legge 21 giugno 2023 n. 74, che ha modificato l’art. 22 del d.l. n. 76/2020 sul controllo concomitante, escludendone l’applicazione per piani, programmi e progetti previsti o finanziati dal PNRR o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Stante la sopravvenuta modifica normativa è stato previsto, con riferimento ai progetti che avevano formato oggetto di ricognizione nel 2022, che sarebbe stato effettuato il solo “controllo sulla gestione” ai sensi dall’art. 7 del d. l. 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 (cfr. SRC Lombardia n.173/2023/INPR).

La deliberazione di rimodulazione richiama il criterio elaborato, in sede nomofilattica, dalle Sezione delle Autonomie “ *la quale, nel ritenere che “i controlli sulla gestione non possono attendere l’esito conclusivo delle attività che, nella maggior parte dei casi, è molto protratto nel tempo” si è espressa nel senso che detti controlli devono “focalizzarsi su segmenti di gestione connessi alla realizzazione degli obiettivi intermedi” (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 1/SEZAUT/2023/INPR)”* (così del. 173 cit.).

In siffatto contesto normativo e giurisprudenziale la valutazione gestionale della Corte, a fronte di interventi che nella maggior parte dei casi dovrebbero giungere a completamento entro il 2026, si concentra sul raggiungimento dei “risultati intermedi e sulla progressione dei relativi procedimenti amministrativi” dei progetti finanziati dal PNRR.

Il controllo sulla gestione, secondo quanto stabilito dall’art. 7 del d.l. n. 77/2021 e s.m.i. e dall’art. 3 della l. n. 20/1994, viene svolto “anche in corso di esercizio”, effettuando

*“valutazioni di economicità efficienza ed efficacia circa l’acquisizione e l’impiego” delle relative risorse, verificando “la legittimità e la regolarità” del loro utilizzo ed accertando “la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge”.*

\*

Si ritiene utile rammentare, in questo sintetico inquadramento normativo, che la Sezione delle Autonomie nel fornire indicazioni sul *“Contributo alla relazione ex art. 7, comma 7, D.L. 31 maggio 2021 n. 77”* (II semestre 2023) si è soffermata sulle finalità del controllo di gestione sui progetti del PNRR e PNC, evidenziando che *“Nella legislazione dedicata al PNRR e in particolare, all’art 1, co. 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, viene fatto riferimento alla responsabilità delle Amministrazioni e degli organismi titolari dei progetti finanziati per l’attuazione del programma Next Generation EU «conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea (...), nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali».* Inoltre, il Documento della Commissione Europea *“Commission Staff Working Document Guidance to Member States Recovery and Resilience Plans”* (SWD-2020 205 final) fa esplicito riferimento a tale profilo, individuando con la locuzione *“sound financial management”*, il concetto di *“sana gestione finanziaria”*, che ricade nel perimetro di controllo che la Corte dei conti è chiamata a garantire. *L’esigenza di un’oculata programmazione e gestione della spesa è fondamentale nell’ottica di preservare la sana gestione finanziaria dell’ente.”* (cfr. Sez. Aut. deliberazione n.16/2023/FRG).

\*

In tale contesto si inserisce la presente deliberazione circoscritta al controllo sulla gestione nella fase di attuazione, finanziaria e procedurale degli interventi di cui il Comune di Brescia è soggetto attuatore e/o beneficiario.

## 2. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

La Sezione nel mese di marzo 2023 ha avviato un'attività istruttoria, integrata nel mese di novembre 2023, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti del PNRR da parte del Comune di Brescia.

Sono stati presi in esame tutti gli interventi gestiti direttamente dall'ente in qualità di "soggetto attuatore", ovvero gli interventi con una ricaduta finanziaria effettiva sul bilancio del Comune, quale soggetto direttamente beneficiario dei finanziamenti stanziati dal PNRR e la cui gestione è sotto il diretto controllo del Comune o di enti strumentali o di supporto coinvolti a vario titolo nella realizzazione dei progetti e individuati dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente (es. in materia di appalti pubblici).<sup>1</sup>

Giova ricordare che gli enti locali sono *soggetti attuatori* qualora provvedano direttamente alla realizzazione degli interventi, oppure *soggetti beneficiari* quando si avvalgono di enti strumentali o di altri soggetti, anche privati, per l'esecuzione del progetto.

Il citato d.l. n. 77/2021 all'art. 10, comma 1, consente, infatti, agli enti locali titolari di fondi del PNRR di affidare le risorse di cui sono beneficiari ad altri soggetti che attuino materialmente gli interventi, tra cui società partecipate *in-house* qualificate ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 50/2026 (ora art. 63 D.lgs. 36/2023). In questo caso l'amministrazione è tenuta a stipulare una convenzione con l'ente strumentale, che ne specifichi il ruolo, la responsabilità e la remunerazione.<sup>2</sup>

Sono esclusi dalla presente analisi gli interventi che, pur avendo una ricaduta sul territorio del Comune, esulano dal perimetro di bilancio dell'Ente.

---

<sup>1</sup> L'art.9 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 (in breve d.l. n. 77/2021) stabilisce che "alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente."

<sup>2</sup> Il beneficiario, anche laddove non figuri come soggetto attuatore, è tenuto a monitorare lo stato di attuazione o dalla rendicontazione delle risorse, che transitano dal bilancio dell'ente. Nel momento del riparto delle risorse, viene infatti siglata una convenzione tra ministero e beneficiario, che stabilisce in dettaglio gli obblighi, tra cui quello di garantire l'attuazione del progetto nei tempi stabiliti dal cronoprogramma e la conservazione di tutta la documentazione contabile allo scopo di garantire la corretta rendicontazione.

\*

La verifica dello stato di avanzamento degli interventi di cui il Comune di Brescia è soggetto attuatore è stata condotta sulla base degli esiti dell'attività istruttoria effettuata nel corso del 2023, integrata dagli elementi conoscitivi della piattaforma ReGiS.<sup>3</sup>

Nel dettaglio, gli interventi di cui il Comune di Brescia è soggetto attuatore sono aggregati per Missione e rappresentati nella seguente tabella.

**Tabella 1 - Progetti PNRR suddivisi per missione e per tipologia**

Missione	n. CUP	% CUP sul totale
M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura	7	17%
M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica	8	19%
M5 Inclusione e coesione	27	64%
<b>Totale complessivo</b>	<b>42</b>	<b>100%</b>

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dai dati estratti da ReGiS.

Si precisa che su ReGiS i progetti risultano 45: due sono doppi ed è in corso la procedura di eliminazione dalla piattaforma, mentre un progetto (CUP 2000219934, missione M2C1I1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti- importo € 936.000,00) è stato inserito successivamente all'istruttoria. Peraltro, in merito a tale progetto sulla piattaforma non risultano informazioni di dettaglio e, di conseguenza, dello stesso non si tiene conto ai fini della presente relazione.

I 42 progetti dei quali il Comune di Brescia è soggetto attuatore/beneficiario sono identificati mediante un Codice Unico di Progetto (CUP). Di questi, sette progetti si

<sup>3</sup> Le informazioni circa gli interventi vengono monitorate attraverso ReGiS, che, come stabilisce la circolare del MEF-RGS n.27 del 21/6/2022, è la piattaforma informatica unica alimentata dai soggetti attuatori coi dati relativi ai progetti del PNRR. La stessa circolare chiarisce che "I soggetti Attuatori sono responsabili della corretta alimentazione del sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di loro competenza. In particolare, provvedono, con cadenza mensile ad aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza." Inoltre, la successiva circolare del MEF-RGS n. 29 del 26 luglio 2022 ha stabilito che la piattaforma ReGiS costituisce la base informativa su cui vengono registrate le varie fasi di attuazione del piano, ovvero avvio, finanziamento, stato di avanzamento dei lavori, fino alla rendicontazione finale, da parte delle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR.

trovano nell'ambito della Missione 1 (Digitalizzazione della PA), otto si trovano nella Missione 2 (Mobilità sostenibile e tutela del territorio) e ventisette nella Missione 5 (Inclusione e coesione).

Nella tabella che segue si rappresenta l'importo totale di tali progetti, aggregati per missione, con indicazione della quota di finanziamento mediante fondi PNRR.

**Tabella 2 - Importo dei Progetti PNRR**

Missione	RRF- (PNRR) (A)	FPCOM-Fondi Propri dei Comuni	FOI	Altro pubblico	Importo totale del progetto (B)	% PNRR sul totale Progetto (A/B)	% PNRR sulla missione (A/Totale della missione)
M1	1.944.222,00 €	-	-	-	1.944.222,00 €	100,0%	2,20%
M2	15.418.512,55 €	1.051.707,01 €	-	-	16.470.219,56 €	93,61%	17,42%
M5	71.145.643,00 €	22.760.539,25 €	2.539.137,80 €	6.014.012,00 €	102.459.332,05 €	69,44%	80,38%
<b>Totale</b>	<b>88.508.377,55 €</b>	<b>23.812.246,26 €</b>	<b>2.539.137,80 €</b>	<b>6.014.012,00 €</b>	<b>120.873.773,61 €</b>	<b>73,22%</b>	<b>100%</b>
<b>% sul totale</b>	<b>73%</b>	<b>20%</b>	<b>2%</b>	<b>5%</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>


Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dai dati estratti da ReGiS.

Il Comune di Brescia risulta, pertanto, soggetto attuatore per un ammontare complessivo di fondi del PNRR pari a più di 88 milioni di euro.

La Missione 1 risulta interamente finanziata da fondi PNRR, la Missione 2 per il 93,61 per cento, mentre la Missione 5 per il 69,44 per cento.


Quest'ultima Missione accentra, inoltre, l'80 per cento dei fondi complessivi nonché il numero maggiore di progetti, pari al 64 per cento dei CUP (27 di 42 totali).

**Grafico 1- Finanziamento PNRR per progetto nelle missioni**

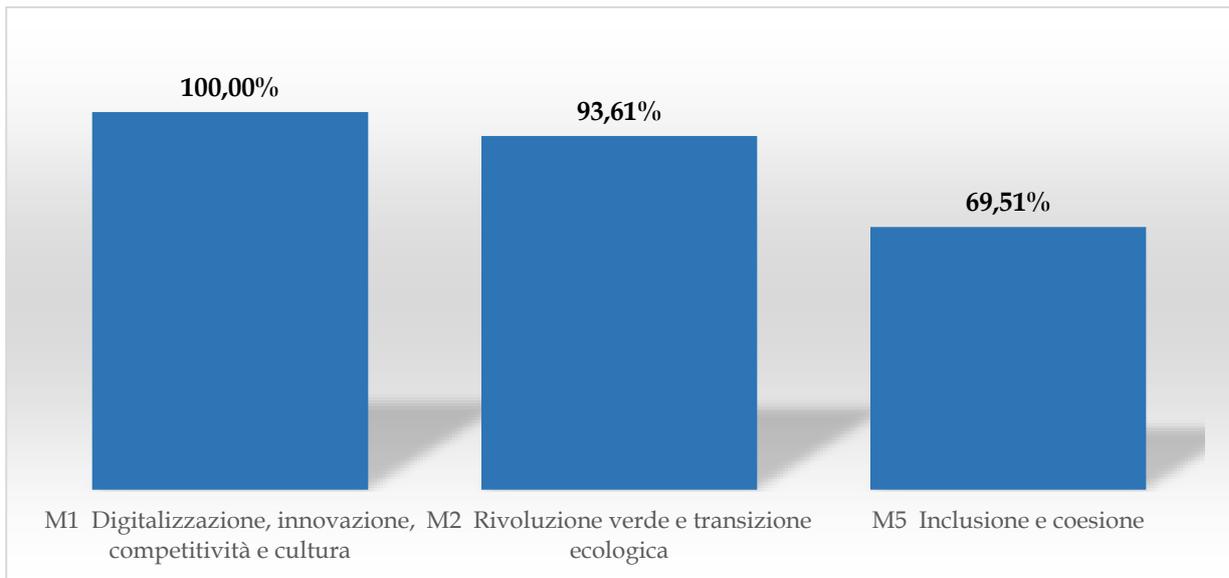

Le risorse provenienti dal dispositivo *Recovery and Resilience Facility* (RRF), ovvero il fondo che finanzia il PNRR, corrispondono al 73 per cento del totale; il resto delle risorse proviene dal Fondo per le Opere Indifferibili (FOI) per il 20 per cento, da altre risorse pubbliche per il 5 per cento e da fondi propri comunali per il 2 per cento.

**Grafico 2 - Fonti dei finanziamenti per i progetti PNRR**

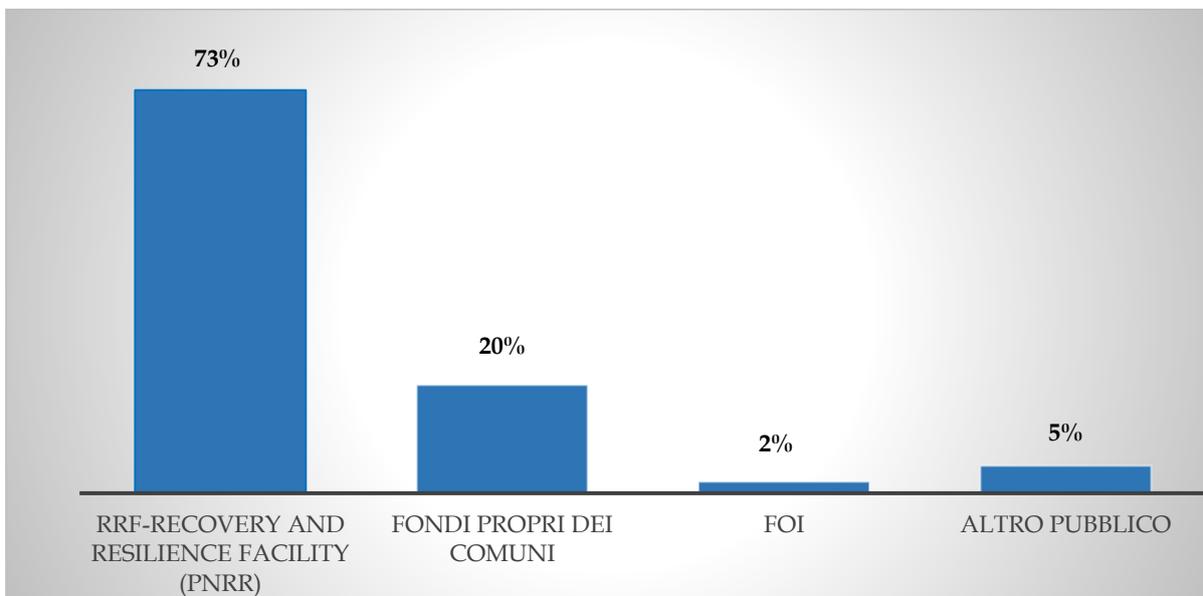

Per il dettaglio dei singoli progetti univocamente identificati mediante il Codice Unico di Progetto (CUP) si rimanda alla tabella generale in calce alla relazione, dove sono riportate in modo dettagliato le informazioni riguardanti i 42 progetti.

Di seguito lo stato di attuazione dei progetti finanziati coi fondi del PNRR, sia per quanto riguarda l'avanzamento procedurale sia per quanto riguarda l'avanzamento finanziario.

\*

## 2.1 Avanzamento procedurale

All'interno della piattaforma ReGiS -ove correttamente implementata- è possibile verificare e monitorare l'avanzamento procedurale mediante l'associazione nel tempo ad ogni singolo CUP di una specifica fase della sequenza dei procedimenti amministrativi. Le possibili fasi dell'attuazione sono così definite: "Progettazione esecutiva", "Pubblicazione bando di gara", "Aggiudicazione", "Stipula contratto", "Esecuzione lavori o Esecuzione fornitura", "Collaudo".

\*

Gli interventi finanziati con i fondi del PNRR seguono un cronoprogramma predefinito a livello nazionale.

Questo implica che i diversi progetti si sviluppino nel rispetto della sequenza temporale all'interno della quale ciascuna fase dell'intervento deve essere completata. A tale proposito si osserva che, mentre il decreto del MEF del 6 agosto 2021 (*"Assegnazione delle risorse finanziarie previste per il PNRR - DM ripartizione traguardi e obiettivi"*) definisce la data con cui gli interventi devono essere conclusi, gli accordi operativi (*"Operational Arrangements"*)<sup>4</sup> stabiliscono le scadenze delle fasi di ciascun intervento del piano.

Fatta questa premessa di ordine generale, con riguardo al Comune in esame va precisato che, dopo aver estratto i dati da ReGiS, è stata formulata una richiesta istruttoria, a cui l'Ente ha dato riscontro (in data 24 novembre 2023, prot. CdC n. 25111), per acquisire aggiornamenti rispetto alle informazioni contenute sulla piattaforma.


---

<sup>4</sup> Si tratta degli accordi che l'Italia ha condiviso con la Commissione Europea (firmati dal Ministro Franco il 23-12-2021):[https://commission.europa.eu/system/files/2021-12/countersigned\\_-\\_italy\\_-\\_rrf\\_-\\_oa\\_1.pdf](https://commission.europa.eu/system/files/2021-12/countersigned_-_italy_-_rrf_-_oa_1.pdf)

La Sezione sulla base del riscontro ha, dunque, accertato la fase procedurale di ogni singolo progetto del PNRR del Comune di Brescia.

Il grafico seguente fornisce in termini aggregati lo stato di attuazione procedurale.

**Grafico 3 - Stato di attuazione procedurale**

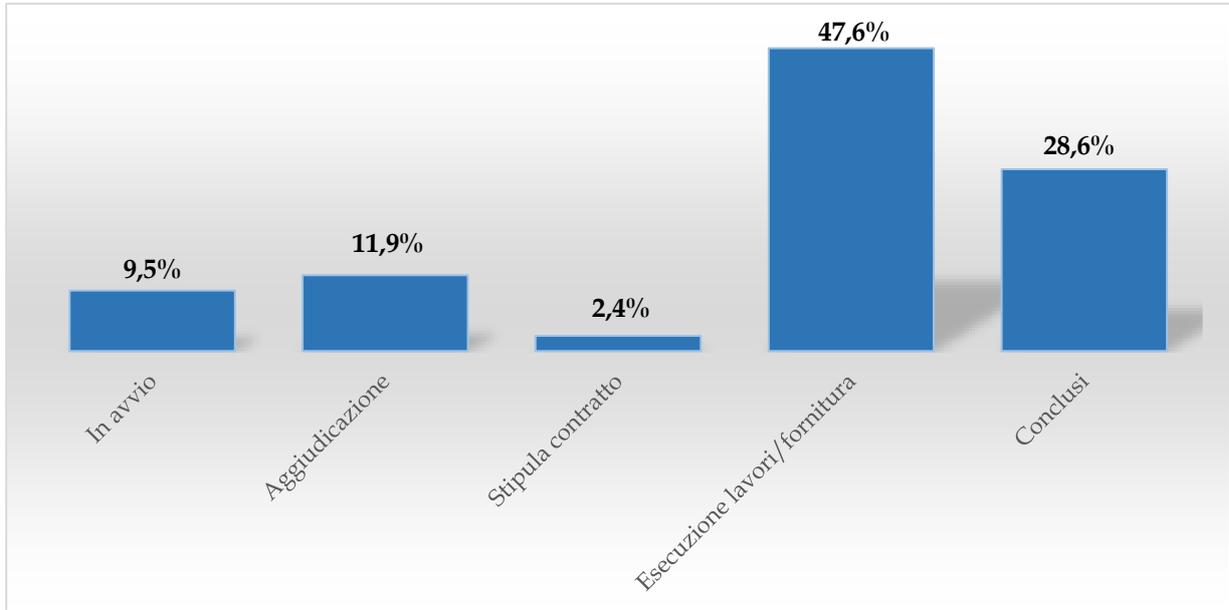

Il grafico mostra come una quota pari al 9,5 per cento dei progetti sia in fase di avvio; nell'11,9 per cento dei casi si è nella fase di aggiudicazione dei lavori o della fornitura del servizio; il 2,4 per cento dei progetti è stato assegnato al soggetto esecutore con cui il Comune ha già stipulato un contratto.

Per la maggior parte dei CUP (47,6 per cento) i lavori sono in fase di esecuzione o i servizi in erogazione.

Il 28,6 per cento degli interventi risulta completato.

La tabella seguente riporta lo stato di avanzamento delle procedure e rappresenta una situazione eterogenea tra le diverse missioni.

**Tabella 3 - Avanzamento procedurale**

	In avvio	Aggiudicazione	Stipula contratto	Esecuzione lavori/fornitura	Conclusi	CUP
M1				4	3	7

M2	1	1		3	3	8
M5	3	4	1	13	6	27
<b>Tot.</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>42</b>

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dai dati estratti da ReGIS.

Nel dettaglio, si osserva come la totalità dei CUP della Missione 1 sia in fase di esecuzione o attenga a progetti conclusi, come la maggior parte dei CUP nella Missione 2 e 5, rispetto alle quali solo quattro CUP risultano ancora in fase di avvio (uno per la Missione 2 e tre per la Missione 5).

Per la verifica dello stato di avanzamento procedurale di ogni singolo progetto si rimanda alla Tabella generale in calce alla relazione.

\*

Per quanto concerne il rispetto del cronoprogramma (al 30 giugno 2023), i revisori dell'Ente hanno reso la Tabella PNRR allegata al Questionario sul bilancio di previsione 2023-2025, redatto in conformità alle Linee Guida della Deliberazione n. 7/SEZAUT/2023/INPR.

Per le iniziative di cui il Comune di Brescia è soggetto attuatore si riscontra una percentuale pari al 90 per cento (ovvero 38 su 42) dei progetti in linea con la tempistica prevista per il termine del I semestre 2023.

Di quattro progetti in ritardo tre afferiscono alla Missione 5 (Inclusione e coesione) e uno solo nella Missione 2 (Mobilità sostenibile e tutela del territorio):

- M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale - CUP C85F21000300004 - *“Consolidamento statico e restauro delle mura storiche della città - anno 2022 - mura storiche e mura del castello di Brescia\*via del castello\*continuazione della pulizia, consolidamento e restauro delle mura venete e del castello di Brescia, compreso il diserbo da erbe infestanti e successive sigillature”*;
- M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e

degrado sociale - CUP C87H21001160004 - *“piste ciclabili\*varie vie\*interventi relativi alle piste ciclabili anno 2022”*;

- M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale - CUP C87H21001200004 - *“piste ciclabili\*varie vie\*interventi relativi alle piste ciclabili anno 2023”*;
- M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP C87H21000940001 - *“opere per il miglioramento della sicurezza stradale e abbattimento barriere architettoniche - anno 2021”*.

Rispetto a tali progetti, solo per uno (1. CUP C85F21000300004 - *“Consolidamento statico e restauro delle mura storiche della città - anno 2022 - mura storiche e mura del castello di Brescia\*via del castello\*continuazione della pulizia, consolidamento e restauro delle mura venete e del castello di Brescia, compreso il diserbo da erbe infestanti e successive sigillature”*) è indicata la ragione del ritardo, ovvero: *“Differimento dovuto alla necessaria integrazione del progetto esecutivo richiesto dalla soprintendenza”*.

Tali progetti si trovano, comunque, in fasi prossime all'esecuzione, alla conclusione o già conclusi, come di seguito si evidenzia:

1. CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO DELLE MURA STORICHE DELLA CITTA' (C85F21000300004): Lavori iniziati il 2 ottobre 2023 - Verbale di consegna ed inizio lavori PG N.0305718/2023 del 3 ottobre 2023;
2. PISTE CICLABILI\*VARIE VIE\*INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI ANNO 2022 (C87H21001160004): Aggiudicazione con D.D. 2480 del 28 settembre 2023;
3. PISTE CICLABILI\*VARIE VIE\*INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI ANNO 2023 (C87H21001200004): Aggiudicazione con D.D. 2481 del 28 settembre 2023;
4. OPERE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE E ABBATIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2021 (C87H21000940001): intervento concluso.

## 2.2 Avanzamento finanziario

La Sezione in sede istruttoria (nota prot. 24202 del 3 novembre 2023) ha chiesto al Comune di Brescia *“di indicare l'importo accertato in bilancio, a seguito del trasferimento di risorse da Regione o Amministrazione centrale, specificando il totale dei pagamenti effettuati dall'Ente”* per ciascun progetto identificato mediante CUP.

A tale richiesta il Comune di Brescia ha dato riscontro trasmettendo informazioni relative allo stato di avanzamento finanziario di ciascun progetto, in particolare relativamente alle risorse complessive accertate in bilancio per l'avvio dei progetti, ovvero provenienti dai trasferimenti statali o regionali.

Si rammenta che l'art. 15, comma 4, del d.l. 77/2021 con finalità acceleratoria ha previsto che gli enti attuatori possano accertare nel loro bilancio le risorse finanziarie che sono loro attribuite dal PNRR su specifici capitoli di spesa, già dalla data del decreto o atto di riparto *“senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti”*.

Questa norma ha consentito di derogare alle regole ordinarie fissate dal principio contabile applicato 4/2 allegato al decreto legislativo n. 118 del 2011, anticipando il momento in cui diviene possibile contabilizzare l'accertamento in entrata necessario alla copertura finanziaria della correlata spesa.

Inoltre, poiché nel PNRR l'avvio dei progetti precede l'erogazione del finanziamento, per gli enti che non abbiano capienza finanziaria sufficiente per avviare gli investimenti, il decreto-legge n. 152 del 2021 *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*, ha previsto all'art. 9, commi 6 e 7, la possibilità di disporre di anticipi di liquidità (nella misura del 10 per cento delle risorse complessive assegnate) su un fondo di rotazione del MEF a gestione speciale da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, sulla base di motivate richieste presentate dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi ricompresi nel PNRR.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> La modalità di contabilizzazione delle anticipazioni è disciplinata dal comma 6 dello stesso decreto, *“per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR”*.

Le informazioni sull'avanzamento finanziario vengono riassunte in forma aggregata per missione nella seguente tabella.

**Tabella 4 - Risorse accertate in bilancio e pagamenti**

	n. CUP	Importo finanziato dal PNRR	Accertamenti (€)	Pagamenti (€)	Pagamenti su accertamenti %
M1	7	1.944.222,00 €	1.944.222,00 €	123.890,00 €	6 %
M2	8	15.418.512,55 €	15.584.017,60 €	1.333.570,16 €	9 %
M5	27	71.145.643,00 €	32.680.362,09 €	6.335.481,62 €	19 %
	<b>42</b>	<b>88.508.377,55 €</b>	<b>50.208.601,69 €</b>	<b>7.792.941,78 €</b>	<b>16 %</b>

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dai dati estratti da ReGIS.

La tabella mostra il totale dei finanziamenti PNRR a disposizione del Comune per l'attuazione dei progetti, così come acquisiti al bilancio dell'Ente.

Si registra, in particolare, una percentuale di risorse accertate pari a circa 50 milioni (57 per cento del finanziamento totale).

I pagamenti, pari a quasi 7,8 milioni, costituiscono il 16 per cento delle risorse accertate. Per quanto riguarda i fondi richiesti e ottenuti dall'Ente in forma di anticipazione, ci si è basati sulle informazioni fornite dai revisori dei conti nella relazione sul PNRR allegata al bilancio di previsione 2023-2025.

Nella tabella che segue sono compendiate i dati aggregati per missioni delle erogazioni ricevute a fronte di un finanziamento con fondi PNRR pari ad euro 88.508.377,55.

**Tabella 5 - Anticipazioni per missioni**

Missione	Importo anticipazione erogata
M1	-
M2	1.076.365,40
M5	6.248.665,50
<b>Totale complessivo</b>	<b>7.325.030,90</b>


Fonte: Tabella PNRR revisori

La somma delle anticipazioni ottenute dal Comune di Brescia è pari a 7,3 milioni di euro e costituisce l'8 per cento (7,3 mln/88,50 mln) delle risorse finanziate; si tratta di

risorse richieste dall'Ente a valere sul fondo di rotazione del MEF per un importo massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento.

Per quanto riguarda l'attuazione finanziaria si notano alcune differenze tra i progetti delle diverse missioni:

**Grafico 4 - Stato di attuazione finanziaria (Pagamenti su fondi accertati in bilancio)**

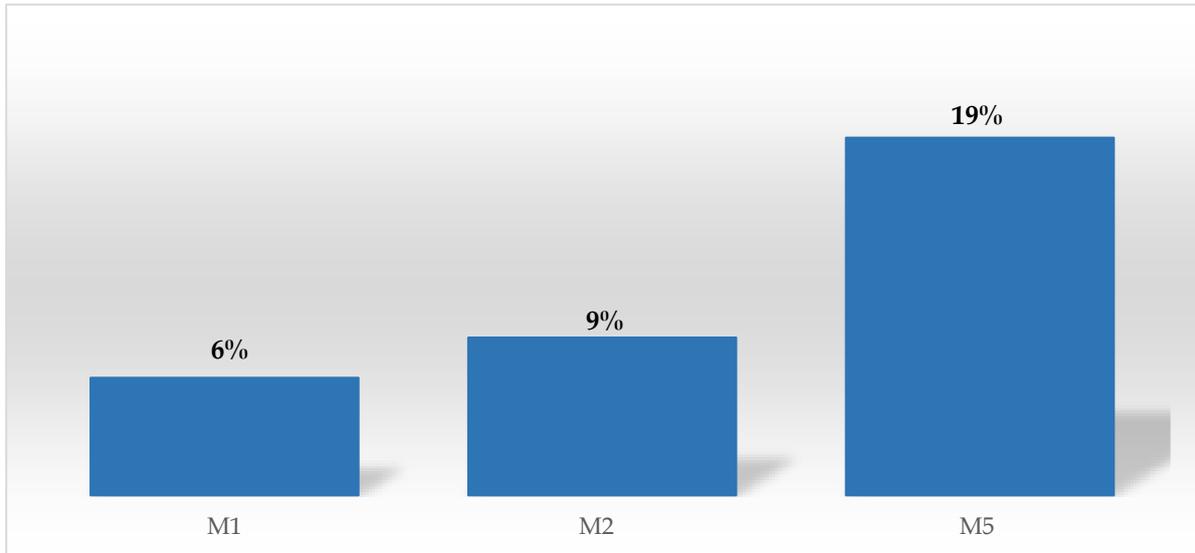

Una maggiore quota di pagamenti su accertato, pari al 19 per cento circa, si rileva nella Missione 5 (Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità); a seguire le due Missioni 1 (Digitalizzazione della PA) e 2 (Mobilità sostenibile e tutela del territorio), rispettivamente per il 6 e 9 per cento ciascuna.

Per quanto riguarda il dettaglio sullo stato dei pagamenti di ciascun progetto identificato mediante CUP, si rimanda alla tabella generale in calce alla relazione.

La Sezione rileva come il livello dei pagamenti complessivi, pari al 16 per cento dei fondi accertati in bilancio, sembri indicare che la rendicontazione delle spese allineata alla tempistica della certificazione dei vari stati di avanzamento dei lavori, sia ancora all'inizio.

### 2.3 Effetti della rimodulazione

Nel giugno 2023 è stata resa pubblica la notizia di una proposta governativa di rimodulazione<sup>6</sup> di alcune misure del PNRR presentata dalla cabina di regia alla Commissione Europea, approvata dal Consiglio dell'Unione Europea l'8 dicembre 2023, con un impatto di potenziale definanziamento di alcuni interventi.

Sul sito del Consiglio dell'Unione Europea è stata recentemente pubblicata la decisione che modifica la decisione del Consiglio del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia corredata (<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16051-2023-ADD-1/it/pdf>).

Le informazioni rese in merito dal Comune non si basano su specifiche comunicazioni dell'Amministrazione erogante, ma sono ricavate dal Dossier del 31 luglio 2023 n. 28/R/1 redatto dal Servizio Studi della Camera dei Deputati.

Non vi è, quindi, allo stato una indicazione analitica dei progetti interessati da definanziamento, ma solo una individuazione potenziale per categoria di interventi.

La proposta di rimodulazione è stata già comunque analizzata per il suo possibile impatto sullo stato di attuazione degli interventi del PNRR dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione 16/2023/FRG) che ha rilevato: *“Tra le principali misure di competenza di Comuni e Città metropolitane espunte dal PNRR si annoverano interventi quali quelli relativi alla prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza dei centri abitati, iniziative di manutenzione e riuso di aree pubbliche ed edifici, nonché di rigenerazione e valorizzazione di aree urbane per le quali sono stati avviati progetti. Ne potrebbe derivare un rallentamento che amplia le difficoltà di realizzare l'ampio parco progetti presentati ed emerge, inoltre, la necessità che le coperture alternative intervengano tempestivamente per evitare l'interruzione dei lavori e il rischio di oneri aggiuntivi”*.

La tabella 6 indica in forma aggregata l'ambito di intervento ed i contributi PNRR interessati da un possibile definanziamento, per complessivi 16,57 milioni di euro, di cui:

---

<sup>6</sup> I cui dettagli si trovano nel Dossier *“Monitoraggio dell'attuazione del PNRR - Le Proposte del governo per la revisione del PNRR e il capitolo RepowerEU”* pubblicato il 31 luglio 2023, a cura del Servizio studi della Camera dei deputati.

- 0,84 milioni di euro per la misura M2C4 I.2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni”;
- 15,73 milioni di euro per la misura M5C2 I.2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”.

**Tabella 6 - Progetti oggetto di possibile definanziamento**

	n. CUP	Importo totale del progetto	Importo finanziato dal PNRR
M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica	4	1.011.013,81 €	840.000,00 €
M5 Inclusione e coesione	18	28.773.750,05 €	15.730.488,00 €
	<b>22</b>	<b>29.784.763,86 €</b>	<b>16.570.488,00 €</b>

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base del riscontro istruttorio.

Nel dettaglio, è emerso che i progetti coinvolti dal possibile definanziamento sono 22, distribuiti su due interventi (M2C4 I.2.2 e M5C2 I.2.1). Si tratta di opere e forniture in fase di esecuzione o già concluse (ad eccezione di due in fase di aggiudicazione), nel rispetto dei tempi di realizzazione imposti dal rispettivo cronoprogramma (tabella 7). Il Comune di Brescia ha, infatti, osservato che per tutti i progetti menzionati sono già stati assunti impegni di spesa, precisando che *“L’eventuale definanziamento di tali interventi, se non riassorbito da assegnazione di risorse statali alternative di pari importo, comporterebbe pesanti criticità in capo al Comune, in termini di competenza, in quanto i contributi assegnati (e a tutt’oggi non revocati) costituiscono copertura finanziaria ad impegni di spesa già perfezionati, corrispondenti ad obbligazioni giuridiche assunte nei confronti dei soggetti terzi aggiudicatari delle relative procedure di affidamento. Non sono al momento prospettabili eventuali ipotesi di rinuncia all’attivazione degli interventi, essendo già in corso o conclusi. Tali criticità attengono, come già accennato, alla copertura finanziaria di competenza. Per quanto riguarda gli equilibri di cassa, l’Ente dispone di sufficiente liquidità per fronteggiare i pagamenti ai soggetti terzi aggiudicatari, assicurando il rispetto dell’indicatore di tempestività*

dei pagamenti, attingendo alle proprie disponibilità, anticipando l'effettivo incasso dei contributi assegnati (PNRR o fonte di finanziamento alternativa)".

**Tabella 7 - Stato di attuazione dei progetti oggetto di possibile definanziamento**


	In avvio	Aggiudicazione	Stipula contratto	Esecuzione lavori/fornitura	Conclusi	Totale complessivo
M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica				1	3	4
M5 Inclusione e coesione		2		10	6	18
		<b>2</b>		<b>11</b>	<b>9</b>	<b>22</b>

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base del riscontro istruttorio.

Per quanto riguarda l'avanzamento procedurale degli interventi che potrebbero essere definanziati, emerge che solo 4 progetti non erano allineati al cronoprogramma alla fine del I semestre 2023, dei quali uno risulta già concluso, uno in fase di esecuzione e due in fase di stipula del contratto.

È possibile confrontare lo stato di attuazione dei progetti coinvolti dal definanziamento rispetto ai 42 progetti complessivi nel seguente grafico.

**Grafico 5 - Stato di attuazione procedurale dei progetti oggetto di definanziamento**

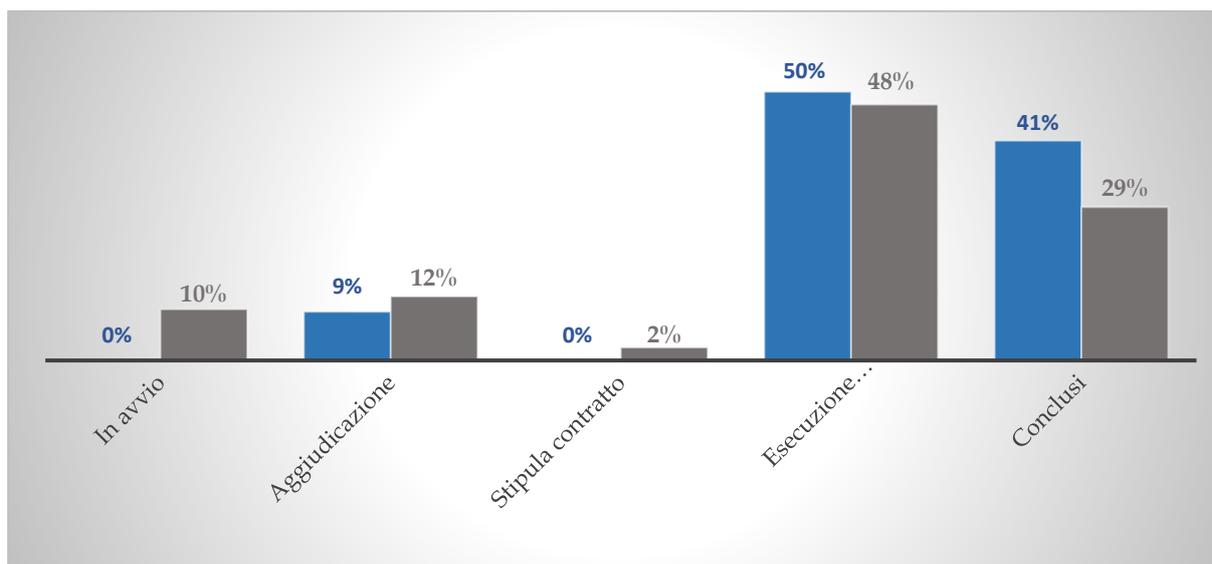

Legenda: con il blu si indica la percentuale dei progetti a seconda della fase di attuazione coinvolti dal definanziamento, mentre in grigio la percentuale sul totale dei 42 progetti.

Risulta, inoltre, che i progetti coinvolti dal definanziamento, che sono in corso di esecuzione o già conclusi, superano la media degli altri progetti nella stessa fase di attuazione.

L'Ente per cofinanziare i progetti assistiti da contribuzione statale, ha dovuto rimodulare la scala delle priorità complessive posticipando la realizzazione di altri interventi.

L'eventuale definanziamento o posticipo della disponibilità delle risorse già assegnate, comporterebbe diversi problemi, tra i quali:

1. nuovi costi per i servizi di Architettura e Ingegneria;
2. possibili contenziosi con gli operatori economici contrattualizzati;
3. interruzione o sospensione delle opere e delle forniture con inevitabili oneri aggiuntivi di varia natura.

La mancata attuazione o il differimento degli interventi non solo precluderebbe di dare soddisfazione alle esigenze della comunità rientranti nelle finalità del bando, ma vanificherebbe le aspettative e la collaborazione di cui l'Ente ha potuto beneficiare nel rapporto con gli amministrati.

### 3. GOVERNANCE E SISTEMI DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL PNRR

Nel 2022 con la citata delibera n. 251/2022/GEST è stato rilevato che, nel quadro delle disposizioni di governance del PNRR dettate dal d.l. n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, tutte le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR sono chiamate a provvedere al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo.<sup>7</sup>

La complessità delle iniziative e i tempi serratamente definiti per il relativo avanzamento e completamento hanno richiesto alle Regioni e alle Province autonome l'adozione di schemi organizzativi a presidio della corretta e tempestiva implementazione delle misure ad esse affidate.

L'attività istruttoria espletata dalla Sezione nel corso del 2022 non aveva evidenziato la predisposizione di una *governance* dedicata da parte del Comune di Brescia.

Da ultimo l'Ente ha rappresentato che è stata individuata un'unità organizzativa per il monitoraggio degli adempimenti PNRR, che è stata promossa l'attivazione di un tavolo tecnico intersettoriale con funzioni di cabina di regia e che si è provveduto ad emanare direttive in materia a tutti i dirigenti dell'Ente.

---

<sup>7</sup> Per una disamina più ampia del quadro normativo in tema di governance del PNRR definita da d.l. n. 77/2021 si fa rinvio alla specifica memoria redatta dalla Corte dei conti, su richiesta dalle Commissioni riunite I (Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati, approvata con deliberazione n. 11/SSRRCO/AUD/21 delle Sezioni riunite in sede di controllo e alla Relazioni delle Sezioni Riunite sullo stato di attuazione del PNRR n. 4 del 29 marzo 2022

## 4. SITUAZIONE DEL PERSONALE

### 4.1 Esperti della Regione

La Sezione con nota istruttoria del 21 marzo 2023 ha chiesto informazioni circa l'eventuale utilizzo del personale esperto assunto dalla Regione, nell'ambito della misura del PNRR M1C1-2.2 *"Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance"* per la semplificazione delle procedure amministrative degli enti locali.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2021<sup>8</sup> col quale veniva stanziata la spesa aveva definito il perimetro dei compiti degli esperti e dei professionisti assunti dalle Regioni per l'Assistenza Tecnica (TA): *"La TA è finalizzata a supportare le amministrazioni territoriali con l'obiettivo di velocizzare le procedure complesse, con particolare riferimento quelle propedeutiche all'implementazione dei progetti previsti PNRR. ...."*

Per questa misura, finanziata con 38,6 milioni in bilancio dal 2021, Regione Lombardia è stata chiamata a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e velocizzazione dei procedimenti amministrativi complessi e, in particolare, delle procedure propedeutiche all'implementazione dei progetti del PNRR.

Il Comune di Brescia, nella risposta del 14 aprile 2023 (Prot. n. 4296) ha dichiarato che *"L'Ente non si è avvalso dei professionisti sopra indicati"*.

---

<sup>8</sup> Il DPCM del 12 novembre 2021 all'art. 1 stabiliva che *"il contributo di 320,3 milioni di euro a valere sul «Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e destinato al conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse, è erogato da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di amministrazione titolare dell'Investimento «2.2: Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance» del PNRR, a favore delle regioni e province autonome."* All'art. 2 che *"il contributo di cui all'art. 1 è finalizzato al conferimento, da parte di regioni e province autonome, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse nel territorio, in funzione dell'implementazione delle attività di semplificazione previste dal PNRR."* All'art.3 che *"ai fini del tempestivo avvio delle procedure di reclutamento, le regioni e province autonome, sentiti gli enti locali, definiscono in via preliminare, entro il 30 ottobre 2021, nei limiti delle assegnazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, i fabbisogni, in termini di profili professionali, secondo lo schema di cui all'allegato C, che forma parte integrante del presente provvedimento."* Infine, all'art. 5 che i Piani territoriali *"sono presentati entro il 5 novembre 2021 e sono soggetti ad approvazione entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne valuta la congruenza."* Con DPCM 29 novembre 2021, attuativo dell'art. 9 del d.l. n. 80/2021, di ripartizione delle risorse tra le Regioni, alla Regione Lombardia sono stati assegnati 38.632.000,00 euro per la contrattualizzazione di 123 esperti.

#### 4.2. Assunzioni di personale a tempo determinato

La Sezione ha chiesto informazioni circa le procedure di rinforzo dell'organico a supporto ai progetti del PNRR.

L'Ente ha dichiarato di aver *“adottato le misure organizzative ritenute necessarie affinché la struttura organizzativa possa adeguatamente e tempestivamente fronteggiare gli adempimenti derivanti dal ruolo di soggetto attuatore degli interventi finanziati dal PNRR, senza ricorrere per ora all'applicazione delle facoltà assunzionali derogatorie, in particolare attraverso l'individuazione di un'unità organizzativa dedicata al monitoraggio degli adempimenti PNRR, l'attivazione di un tavolo tecnico intersettoriali con funzioni di cabina di regia, l'emanazione di direttive a tutti i dirigenti dell'Ente. Tale situazione è stata riscontrata anche dal Collegio dei Revisori, da ultimo, nel parere favorevole espresso sullo schema di rendiconto 2022 (approvato dalla Giunta comunale con deliberazione 30/3/2023 n. 154 per la successiva deliberazione consiliare attesa entro la fine del corrente mese di aprile), di cui si riportano brevemente alcuni stralci, per quanto di più diretto interesse in questa sede”*.

Nella risposta istruttoria del 24 novembre 2023 l'Ente ha ribadito di non avere fatto *“ricorso ad assunzioni di spesa del personale specificamente a supporto dei progetti del PNRR”*.

## 5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce dell'attività istruttoria di questa Sezione avviata nel marzo 2023 e aggiornata al 24 novembre 2023, nonché dei dati estrapolati da ReGiS, si espone il seguente quadro di sintesi.

### ➤ *PNRR*

Il Comune di Brescia risulta soggetto attuatore di 42 progetti (ciascuno identificato da un Codice Unico di Progetto, detto CUP) per un ammontare complessivo di fondi del PNRR pari a poco più di 88 milioni. La Missione 5 (Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità) accentra la maggiore quota di fondi (80 per cento) e concentra il numero maggiore di CUP (27 di 42 totali). Risulta inserito in ReGiS, successivamente al completamento dell'istruttoria, un ulteriore progetto per il quale, come sopra evidenziato, non sono disponibili informazioni di dettaglio ed il cui esame si rinvia a futuri approfondimenti. I 42 progetti sono alimentati anche da altre risorse (FOI per 2,5 milioni di euro, da fondi propri del Comune per 23,81 milioni di euro e da altre fonti pubbliche per 6 milioni di euro).

### ➤ *Attuazione procedurale*

- il 9,5 per cento è in fase di avvio
- l'11,9 per cento in fase di aggiudicazione
- il 2,4 per cento è prossimo alla stipula del contratto con il soggetto esecutore
- il 47,6 per cento dei progetti è in corso di esecuzione
- il 28,6 per cento è stato completato.

### ➤ *Cronoprogramma*

In base alla Tabella PNRR allegata al bilancio di previsione 2023-2025, al 30 giugno 2023 il 90 per cento dei CUP un allineamento dei tempi procedurali previsti (ovvero 38 su 42). Nella citata tabella è segnalato un ritardo rispetto al

cronoprogramma per 4 progetti; di questi uno è già concluso, uno è in fase di esecuzione e due sono prossimi alla stipula del contratto.

#### ➤ **Avanzamento finanziario**

Le risorse accertate sono pari al 57 per cento circa dei fondi complessivi a disposizione dell'Ente in qualità di soggetto attuatore o beneficiario. I pagamenti complessivi costituiscono il 16 per cento dei fondi accertati in bilancio (con una eterogenea distribuzione tra i CUP) a conferma che l'avanzamento esecutivo degli interventi è ancora all'inizio.

#### ➤ **Anticipazioni ricevute**

L'importo complessivo è di 7,3 milioni di euro corrispondente all'8 per cento (7,3 mln/88,50 mln) delle risorse finanziate dal PNRR.

#### ➤ **Ipotesi rimodulazione**

Sulla proposta di definanziamento, approvata dalla Commissione Europea e dal Consiglio UE, il Comune non ha ancora ricevuto formali comunicazioni. Sulla base di quanto riportato nel Dossier della Camera dei Deputati del 31 luglio 2023 n. 28/R/1 l'Ente dichiara che potrebbero essere coinvolti 22 progetti distribuiti su due interventi per un importo di 16,57 milioni, pari al 18 per cento se rapportato all'importo complessivo di fondi PNRR (88 milioni). In relazione a tali progetti, l'Ente rappresenta che *"... i contributi assegnati (e a tutt'oggi non revocati) costituiscono copertura finanziaria ad impegni di spesa già perfezionati, corrispondenti ad obbligazioni giuridiche assunte nei confronti dei soggetti terzi aggiudicatari delle relative procedure di affidamento. Non sono al momento prospettabili eventuali ipotesi di rinuncia all'attivazione degli interventi, essendo già in corso o conclusi"*. La Sezione rileva che la quota degli importi interessati sul complesso dei finanziamenti PNRR appare di rilievo e che, qualora alle obbligazioni giuridicamente vincolanti venga a mancare la certezza della fonte del trasferimento statale, si porrebbe un problema di copertura che richiederebbe di essere affrontato tempestivamente per non creare squilibri nel bilancio dell'Ente. D'altra parte, va evidenziato come i progetti che potrebbero essere

coinvolti dall'ipotesi di definanziamento si trovino di avanzata esecuzione e, in taluni casi, già completati; vanno, quindi, sottolineate le possibili gravose conseguenze correlate al sorgere di contenziosi ed ai costi generali di gestione nell'eventualità di interruzione o sospensione degli interventi. Nelle successive verifiche sull'attuazione del PNRR si valuteranno gli effetti del definanziamento sugli specifici progetti e le misure messe in campo dal Comune a salvaguardia degli equilibri di bilancio.

➤ ***Misure organizzative***

Il Comune ha adottato specifiche iniziative per fronteggiare gli adempimenti richiesti per l'attuazione del PNRR. È stata costituita un'unità organizzativa dedicata al monitoraggio degli adempimenti PNRR, attivato un tavolo tecnico intersettoriale con funzioni di cabina di regia ed emanate direttive a tutti i dirigenti dell'Ente, assicurando il rispetto del cronoprogramma per oltre il 90 per cento dei progetti di cui il Comune è soggetto attuatore.

➤ ***Personale di supporto PNRR***

Il Comune di Brescia ha dichiarato di non essersi avvalso né degli esperti assunti dalla Regione, né della deroga ai limiti assunzionali per il personale a tempo determinato.

**Tabella 8 - Elenco dettagliato dei progetti del Comune di Brescia**

	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	Importo TOTALE PROGETTO (dati ReGiS)	Importo finanziato dal PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	NOTE
1	M1	C81C22000100006	Abilitazione al Cloud - Comuni - Aprile 2022	1.031.574,00 €	1.031.574,00 €	1.031.574,00 €	- €	Tutte le azioni previste sono state contrattualizzate; il progetto è in fase di esecuzione.	FASE PROCEDURALE: ESECUZIONE
2	M1	C51F22005090006	PDND - Comuni - Ottobre 2022	203.435,00 €	203.435,00 €	203.435,00 €	- €	In corso, prevista stipula contratto in data 24.02.2024	FASE PROCEDURALE: ESECUZIONE CONTRATTUALIZZAZIONE
3	M1	C81F22000300006	Esperienza del Cittadino - Comuni - Aprile 2022	516.323,00 €	516.323,00 €	516.323,00 €	- €	Tutte le azioni previste sono state contrattualizzate; il progetto è in fase di esecuzione.	FASE PROCEDURALE: ESECUZIONE
4	M1	C81F22000020006	pagoPA - Comuni - Aprile 2022	54.940,00 €	54.940,00 €	54.940,00 €	54.940,00 €	PROGETTO CONCLUSO ED ASSEVERATO; IN ATTESA DI EROGAZIONE FINANZIAMENTO	FASE PROCEDURALE: CONCLUSO
5	M1	C81F22000180006	app IO - Comuni - Aprile 2022	54.950,00 €	54.950,00 €	54.950,00 €	54.950,00 €	PROGETTO CONCLUSO ED ASSEVERATO; IN ATTESA DI EROGAZIONE FINANZIAMENTO	FASE PROCEDURALE: COLLAUDO
6	M1	C81F22000170006	SPID CIE - Comuni - Aprile 2022	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	PROGETTO CONCLUSO ED ASSEVERATO; IN ATTESA DI EROGAZIONE FINANZIAMENTO	FASE PROCEDURALE: CONCLUSO
7	M1	C81F22003140006	Notifiche Digitali - Comuni - Settembre 2022	69.000,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €	- €	Tutte le azioni previste sono state contrattualizzate; il	FASE PROCEDURALE: ESECUZIONE

INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	Importo TOTALE PROGETTO (dati ReGiS)	Importo finanziato dal PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	NOTE	
							progetto è in fase di esecuzione.		
8	M2	C81B22000360006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA ARICI PLESSO VALDADIGE	3.853.538,00 €	3.153.538,00 €	3.153.244,81 €	30.432,96 €	Aggiudicazione Appalto Integrato R.T Pavoni/Nocivelli avvenuta in data 13/09/2023 con Determina 2324/2023	LA DATA STIPULA INDICATA IN REGIS E' QUELLA PREVISTA IL QUADRO ECONOMICO IN REGIS E' STATO AGGIORNATO E L'IMPORTO CORRETTO E' € 3.853.538,00. E' STATA INVIATA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE COMPETENTE
9	M2	C87H21000940001	OPERE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2021	420.000,00 €	420.000,00 €	405.105,04 €	380.620,86 €	Intervento Concluso CRE 11.11.2022	Nota: <b>Dossier revisione PNRR</b>
10	M2	C84J22000610001	STADIO RUGBY ALDO INVERNICI DI VIA MAGGIA*VIA MAGGIA 18*RELAMPING LED STADIO INVERNICI DI VIA MAGGIA	166.976,52 €	105.000,00 €	105.000,00 €	166.976,52 €	Intervento concluso Attestazione regolarità della esecuzione 22.12.2022	Nota: <b>Dossier revisione PNRR</b>

	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	Importo TOTALE PROGETTO (dati ReGiS)	Importo finanziato dal PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	NOTE
11	M2	C83D22000230006	MOBILITA SICURA 2022 OPERE DI ELIMINA	210.000,00 €	210.000,00	105.000,00 €	168.983,55 €	Lavori terminati in agosto 2023	Certificato Fine lavori 28/8/2023 Certificato Regolare esecuzione 13/11/2023. Nota: Dossier revisione PNRR
12	M2	C84J23000390001	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PNRR MISS.2 COMP.4 INV.2.2 - CENTRO CASAZZA*VIA CASAZZA*REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	214.037,29	210.000,00 €	210.000,00 €	- €	Affidamento Chiavi in mano BSI Contratto firmato il 13/09/2023. 15.09.2023 iniziati i lavori.	Nota: <b>Dossier revisione PNRR</b>
13	M2	C81B22002110001	REALIZZAZIONE DI CICLOVIA URBANA NELL'AMBITO DEL RAFFORZAMENTO DELLA MOBILITA' CICLISTICA	1.987.625,20 €	1.806.932,00 €	1.987.625,20 €	29.756,80 €	Greenway del Mella progetto definitivo consegnato in data 4/03/2023 conferenza dei servizi decisoria conclusa il 1/09/2023. In fase di approvazione progetto definitivo	Approvato progetto definitivo con DGC 420 del 18.10.2023
14	M2	C87H20002420001	PROGETTO CICLAGILI	954.388,55 €	954.388,55 €	954.388,55 €	556.799,47 €	Intervento a legislazione vigente - In fase di conclusione	Sal 8 pg 340487/2023 del 2/11/2023
15	M2	B80J22000030007	FORNITURA DI AUTOBUS URBANI AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA E RELATIVE INFRASTRUTTURE DI RICARICA.*VIA SAN	8.663.654,00 €	8.663.654,00 €	8.663.654,00 €	- €	Soggetto attuatore ATI Brescia Trasporti Spa- Arriva Italia Srl Brescia Trasporti Spa con provvedimento dell'Amministratore Unico n. 23 del 21/7/23 ha aderito alla convenzione CONSIP ID2532	Brescia Trasporti Spa: Ordine Consip 7407849 del 18/9/23

INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	Importo TOTALE PROGETTO (dati ReGiS)	Importo finanziato dal PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	NOTE
		DONINO N. 30*AUTOBUS URBANI DI CLASSE I					e in data 18/9/2023 inserito l'ordinativo d'acquisto di n. 7407849 per l'acquisto n. 12 bus elettrici; Arriva Italia Srl in data 25/7/2023 ha pubblicato l'avviso GUUE S141-450827 per l'acquisto di n. 3 bus elettrici.	
16	M5	C84H22000100007 1.1.2-AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	2.460.000,00 €	2.460.000,00 €	733.280,00 €	8.988,00 €	Convenzione col Ministero in data 04/05/2023 . Avvio attività comunicata in data 04/08/2023. Con delibera di giunta 288/2023 è stato finalizzato l'accordo con Brescia Solidale per la ristrutturazione di 5 immobili comunali siti in via Zappa. Accordo tra i 5 ambiti territoriali associati concluso e firmato a fine agosto.	delibera di giunta n. 288/2023 relativa all'assegnazione alla Fondazione Brescia solidale
17	M5	C84H22000130007 INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ	715.000,00 €	715.000,00 €	615.000,00 €	- €	Progetto Ammesso a Finanziamento .Firmata convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 28.09.2022 Inviata avvio attività e ricevuto anticipo del 10per cento Inviata al Ministero modifica di budget e cronoprogramma. In attesa di	Con determinazione dirigenziale n. 2646 del 20/10/2023 è stato approvato il progetto definitivo e relativo cronoprogramma, quadro finanziario e schema di convenzione. La fase procedurale in ReGiS è di aggiudicazione.Si è in fase di

INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	Importo TOTALE PROGETTO (dati ReGiS)	Importo finanziato dal PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	NOTE
							autorizzazione ministeriale per conclusione procedura di coprogettazione con approvazione progetto definitivo , cronoprogramma quadro finanziario	firma convenzione con ETS La data di ultimo atto in ReGiS è quella del primo atto caricato in ReGiS. L'ultimo risale al 10.11.23. Si allega determinazione di riferimento.
18	M5	C84H22000280007 1.1.3 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARIETA'	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	- €	Progetto Ammesso a Finanziamento e Ammesso in Piattaforma Multifondo. Firmata Convenzione con MLPS e fatta DIA. Firmato accordo con gli ATS partner. In corso tavoli di lavoro con ASST Spedali Civili per ed aggiornamento ed integrazione del protocollo dimissioni protette, svolti incontri con Fond. BS Solidale per confronto sulle attività da svolgere.	
19	M5	C84H22000110007 1.1.4 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI	210.000,00 €	210.000,00 €	197.700,00 €	65.100,00 €	Firmato accordo con MLPS. Conclusa procedura di co progettazione, fatta DIA, approvato progetto finale ed impegno di spesa. Avviati a maggio percorsi di supervisione mono professionale, realizzata la survey sul burn out, in avvio	Contrtratto rep 1817 del 26.10.2023

	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	Importo TOTALE PROGETTO (dati ReGiS)	Importo finanziato dal PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	NOTE
								percorsi di supervisione organizzativa che coinvolge anche operatori di ASST ed ETS.	
20	M5	C84H22000120007	1.3.1-HOUSING TEMPORANEO	710.000,00 €	710.000,00 €	313.563,74 €	37.439,69 €	Delib. n. 307 del 12.07.2023 di APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO CON ESECUTIVO STRUTTURALE per l'intervento di Via Corridoni e RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO a € 1.670.000,00 In corso di esecuzione approfondimenti per specifiche analisi del terreno e redazione del piano di bonifica, per integrazione progetto esecutivo (con incremento di spesa per cui è stata richiesta variazione di Bilancio in fase di approvazione)	
21	M5	C84H22000140007	1.3.2-STAZIONI DI POSTA	1.090.000,00 €	1.090.000,00 €	1.270.000,00 €	80.599,36 €	Determina di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica n° 438 del 20-02-2023. Determina aggiudicazione del 31/07/2023 (Angolo) I lavori dovrebbero iniziare la prima settimana di ottobre 2023 e	Determina di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica n° 438 del 20-02-2023. CENTRO DIURNO ODORICI: aggiudicazione con DD 1963/2023 lavori avviati in data 2/10/2023 CENTRO DIURNO

INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	Importo TOTALE PROGETTO (dati ReGiS)	Importo finanziato dal PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	NOTE
							terminare a marzo 2024 (nel caso non venga concesso da ALER L'utilizzo del cortile per il cantiere i lavori dureranno 12 mesi). Pubblicata l'indagine di mercato per l'individuazione dell'impresa edile per l'esecuzione dei lavori in Via Industriale con scadenza 14 settembre.	"ANGOLO": lavori aggiudicati ed affidati D.D. 2692 del 26/10/2023
22	M5	C83D21002610009 RECUPERO DEL FABBRICATO DENOMINATO "EX ARICI SEGA NELLA LOCALITA' CASE	12.127.000,05 €	1.983.988,00 €	2.182.386,80 €	905.318,60 €	Entrambi i lotti aggiudicati: Lotto I DD 1545 del 07/06/2023 firma del contratto 27.07.2023 Lotto II DD 1521 del 05/06/2023 firma del contratto 25.07.2023	INIZIO LAVORI per entrambi i lotti Processo verbale di consegna e inizio lavori Lotto 1 PG 0323727/2023 del 17/10/2023 Verbale di consegna lavori lotto 2 PG 0323744/2023 del 17/10/2023 Nota: <b>Dossier revisione PNRR</b>
23	M5	C89J21012540004 BONIFICA PARCO LIVORNO*VIA LIVORNO*BONIFICA AMBIENTALE	6.270.000,00 €	5.700.000,00 €	5.554.689,15 €	807.441,35 €	Contratto stipulato il 27/10/2022 Consegnati i lavori in data 12/12/2022	Fase ReGiS corretta: ESECUZIONE LAVORI Nota: <b>Dossier revisione PNRR</b>
24	M5	C89J21012550004 BONIFICA PARCO FURA NORD*VIA FURA*BONIFICA AMBIENTALE	792.000,00 €	720.000,00 €	792.000,00 €	109.421,50 €	Contratto stipulato in data 08/02/2023 Consegnati i lavori in data 22/03/2023	Nota: <b>Dossier revisione PNRR</b>

	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	Importo TOTALE PROGETTO (dati ReGiS)	Importo finanziato dal PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	NOTE
25	M5	C89J21012560004	PARCO FURA SUD*VIA FURA*BONIFICA AMBIENTALE	946.000,00 €	860.000,00 €	946.000,00 €	12.200,00 €	Contratto stipulato in data 08/02/2023 Consegnati i lavori in data 24/03/2023	Nota: <b>Dossier revisione PNRR</b>
26	M5	C87H21001600005	CIMITERO VANTINIANO*VIA MILANO*RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	1.000.000,00 €	954.000,00 €	954.000,00 €	860.617,86 €	Esecuzione lavori Al 4.7.2023 contabilizzati lavori per euro 741,313,54 (SAL 3) Ottenua autorizzazione da parte del ministero per variante in corso d'opera. 25.09.2023 ripresi i lavori.	Autorizzata variante in corso d'opera verbale di sospensione lavori PG N.0334212/2023 del 26/10/2023 verbale di ripresa dell'esecuzione PG N.0347640/2023 del 09/11/2023 Nota: <b>Dossier revisione PNRR</b>
27	M5	C87H21001740004	PALAZZO MARTINENGO (EX SEDE DELLA CORTE D'APPELLO)*VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA, 18 COMPLETAMENTO DELLA SALA DEL CAMINO DI PALAZZO MARTINENGO (EX SEDE DELLA CORTE D'APPELLO) CON RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ADIBITI A MANIFESTAZIONI/EVENTI SOCIALI, CULT	220.000,00 €	200.000,00 €	220.000,00 €	170.679,71 €	Contratto stipulato in data 17/03/2023 Lavori iniziati 18/07/2023. Contabilizzato il 1 SAL	Certificato di ultimazione dei lavori 29/09/2023 Nota: <b>Dossier revisione PNRR</b>

INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	Importo TOTALE PROGETTO (dati ReGiS)	Importo finanziato dal PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	NOTE	
28	M5	C87H21001750004	PALAZZO MARTINENGO (EX CORTE D'APPELLO)*VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA, 18 RIQUALIFICAZIONE VARI LOCALI PIANO TERRA E PORZIONE DI COPERTURA DI PALAZZO MARTINENGO (EX SEDE DELLA CORTE D'APPELLO) AI FINI DEL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI PER FI	274.250,00 €	242.500,00 €	266.750,00 €	176.918,24 €	Esecuzione lavori: Al 14/7/2023 contabilizzato SAL 1 per Euro 137.717,19	Certificato di ultimazione dei lavori 15/09/2023 Nota: <b>Dossier revisione PNRR</b>
29	M5	C87H21001760004	CENTRO CIVICO CASAZZA E SPAZI PERTINENZIALI*VIA CASAZZA,	700.000,00 €	450.000,00 €	495.000,00 €	378.391,59 €	Lavori iniziati il 24.3.2023 Ottenuta autorizzazione da parte del ministero per variante in corso d'opera.	Autorizzata variante in corso d'opera Contabilizzato SAL 2 Nota: <b>Dossier revisione PNRR</b>
30	M5	C87H21001770004	EX BIBLIOTECA SCUOLA CRISPI*VIA GEROLAMO LAMBERTI, 4*RECUPERO	272.500,00 €	225.000,00 €	247.500,00 €	210.945,86 €	Esecuzione lavori CONTABILIZZATO SAL 1 PER UN IMPORTO DI euro 95.618,76	Contabilizzato SAL 2 Nota: <b>Dossier revisione PNRR</b>
31	M5	C87H21001120004	RETE CICLABILE VIA LAMARMORA E ALTRE*VARIE VIE*INTEREVENTI PER LA	1.150.000,00 €	1.125.000,00 €	1.115.810,29 €	31.163,54 €	Contratto stipulato. Consegna dei lavori effettuata in data 26.6.2023.	Verbale Consegna lavori PG 222282/2023 Nota: <b>Dossier revisione PNRR</b>
32	M5	C87H21001160004	PISTE CICLABILI*VARIE VIE*INTREVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI ANNO 2022	549.000,00 €	490.000,00 €	539.000,00 €	- €	Greenway del Mella Progetto definitivo approvato il 30/08/2023 Progetto esecutivo approvato	Aggiudicazione DD 2480 del 28/9/23 LA DATA STIPULA INDICATA IN REGIS È

INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	Importo TOTALE PROGETTO (dati ReGiS)	Importo finanziato dal PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	NOTE
							il 30/08/2023 Avvio della gara 01/09/2023 Determina Aggiudicazione 28/09/2023	QUELLA PREVISTA Nota: <b>Dossier revisione PNRR</b>
33	M5	C87H21001200004	PISTE CICLABILI*VARIE VIE*INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI ANNO 2023	1.049.000,00 €	490.000,00 €	539.000,00 €	- € Greenway del Mella Progetto definitivo approvato il 30/08/2023 Progetto esecutivo approvato il 30/08/2023 Avvio della gara 01/09/2023 Determina aggiudicazione 28/09/2023	Aggiudicazione DD 2481 del 28/9/23 LA DATA STIPULA INDICATA IN REGIS È QUELLA PREVISTA Nota: <b>Dossier revisione PNRR</b>
34	M5	C85F21000300004	CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO DELLE MURA STORICHE DELLA CITTA' -	520.000,00 €	210.000,00 €	231.000,00 €	65.095,78 € Aggiudicazione 5.7.2023 contratto stipulato il 27/07/2023 inizio lavori previsto il 2/10/2023	Lavori iniziati il 02/10/2023 Verbale di consegna ed inizio lavori PG N.0305718/2023 del 03/10/2023 Nota: <b>Dossier revisione PNRR</b>
35	M5	C85F21000310004	PALAZZINA HAYNAU - CASTELLO DI BRESCIA*VIA DEL CASTELLO*RIFACIMENTO	670.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	509.376,95 € Conclusi i lavori di rifacimento copertura come da previsione (20/01/2023) Approvato CRE con DD 16/6/2023 Nolo Ponteggio attestazione regolarità servizio 10/2/2023 Servizio Rifacimento intonaci di pareti e restauro di pareti lapidee concluso il 30/06/2023	Nota: <b>Dossier revisione PNRR</b>

	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	Importo TOTALE PROGETTO (dati ReGiS)	Importo finanziato dal PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	NOTE
36	M5	C85F21000320004	COMPLESSO DI S. GIULIA - MUSEO DELLA CITTA' - SITO UNESCO*VIA	770.000,00 €	720.000,00 €	676.408,88 €	740.930,48 €	Intervento concluso CRE DD 10/01/2023 n. 22	Nota: <b>Dossier revisione PNRR</b>
37	M5	C85F21000330004	PALAZZO AVOGADRO IN CORSETTO S. AGATA - EDIFICIO COMUNALE DI	564.000,00 €	360.000,00 €	396.000,00 €	153.148,64 €	Contratto affidamento lavori stipulato in data 14/7/2023 Lavori iniziati 12/09/2023	Verbale di consegna dei lavori PG N.0286949/2023 del 13/09/2023 Nota: <b>Dossier revisione PNRR</b>
38	M5	C86J21000000004	CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO DELLE MURA STORICHE DELLA CITTA' DI	300.000,00 €	250.000,00 €	109.149,04 €	107.360,53 €	Intervento concluso - Strada del soccorso CRE DD 12/10/2022 N. 2546 - Muro crollato CRE DD 16/6/2022 n. 1505	Nota: <b>Dossier revisione PNRR</b>
39	M5	C81B21003640001	COMPENDIO IMMOBILIARE TORRE TINTORETTO*VIA JACOPO ROBUSTI, 90*DEMOLIZIONE DELLA TORRE TINTORETTO E COSTRUZIONE DI UN NUOVO COMPLESSO DI SOCIAL HOUSING	42.400.155,00 €	42.400.155,00 €	4.240.015,50 €	100.996,48 €	Schema di convenzione siglata tra MIMS e Comune Brescia Prot. 342533 del 3/11/2022, approvata con D.D. del MIT Prot. n. 23995 del 29/11/2022. In fase di istruttoria permesso di costruire convenzionato. In corso verifica ai fini della validazione della progettazione esecutiva . Precedente progetto definitivo (2021) per candidatura a bando Pinqua. Progetto successivamente confluito PNRR con richiesta di ottimizzazioni progettuali.	Il progetto è risultato beneficiario del FOI 2023 per € 17.327.889,07. L'importo dell'opera verrà aggiornato in ReGiS dopo l'approvazione del progetto esecutivo, alla quale seguirà la procedura di affidamento, che verrà avviata entro Dicembre 2023

INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	Importo TOTALE PROGETTO (dati ReGiS)	Importo finanziato dal PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	NOTE
							Gara lavori prevista ottobre 2023.	
40	M5	C85B22000130005 IMPIANTO INDOOR DESTINATO A PIU' DISCIPLINE SPORTIVE	16.251.335,85 €	3.500.000,00 €	4.137.188,65 €	151.927,20 €	Aggiudicazione dell'appalto integrato in data 29.3.2023 (Determinazione di presa d'atto in data 31/03/2023) notificata al Dipartimento dello sport in data 31 marzo 2023 Stipulato contratto affidamento appalto integrato 31.5.2023. Avvio della progettazione esecutiva in data 13 giugno 2023	Verbale di avvio esecuzione del contratto 13/06/2023
41	M5	C85B22000120005 CENTRO DI PREPARAZIONE OLIMPICO PER LA GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE	9.519.091,15 €	4.000.000,00 €	4.878.800,35 €	110.001,56 €	Aggiudicazione dell'appalto integrato in data 29.3.2023 (Determinazione di presa d'atto in data 31/03/2023) notificata al Dipartimento dello sport in data 31 marzo 2023. Stipulato contratto affidamento appalto integrato 31.5.2023. Avvio della progettazione esecutiva in data 13 giugno 2023	Verbale di avvio esecuzione del contratto 13/06/2023 PG N.0206905/2023 del 26/06/2023
42	M5	C86J21000010004 PALAZZO LOGGIA*PIAZZA LOGGIA, 1*INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE	600.000,00 €	500.000,00 €	450.119,69 €	541.418,70 €	Tutti i Lavori e servizi Conclusi - Restauro Serramenti salone Vanvitelliano CRE DD 12/4/2023 N.1035	Nota: <b>Dossier revisione PNRR</b>

	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	Importo TOTALE PROGETTO (dati ReGiS)	Importo finanziato dal PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	NOTE
								- Rifacimento gronda lato est lavori ultimati (in corso di redazione del CRE) - altri servizi complementari tutti conclusi e saldati	

Fonte: Riscontro istruttorio e dati estratti da ReGiS

